

# PLAN DE PODA INVERNO 2014-15

Concello de Santiago de Compostela



**ferrovial**  
servicios

- 01. Obxecto da poda**
- 02. Obxectivos perseguidos**
- 03. Frecuencia de poda**
- 04. Métodos de poda**
- 05. Organización**
- 06. Equipos de traballo e zonas**
- 07. Programación**

# 01. Obxecto da poda

Sistema que permite canalizar o vigor dos vexetais leñosos, adaptando a cada ámbito particular o volume da copa das árbores.

# 02. Obxectivos perseguidos

- Adaptar as partes aéreas do arborado a un nivel axeitado á súa especie, función e contorna, cun **custe económico e ambiental sostible**.
- Adecuar a estrutura da copa dos exemplares que na actualidade non están correctamente formados, para **minimizar as frecuencias e diámetros de corte**; diminuindo o risco de entrada de **enfermidades** por fungos e insectos escolítidos.
- **Minimizar as afeccións e molestias a terceiros** (cidadáns, administracións ou bens).
- **Minimizar o volume de residuos xerados e de recursos requiridos**.

# 03. Frecuencia de poda (4 anos)

	Frecuencia 1 ano	Frecuencia 2 anos	Frecuencia 3 anos	Frecuencia 4 anos	Formación Xuvenil	Formación Non Poda	TOTAL POR ANO
1º ano	1.102	3.058	137	49	2.146	3.750	10241 árbores
2º ano	1.102	3.058	137	49	2.146	3.750	10241 árbores
3º ano	1.102	3.058	137	49	1.081	0	5427 árbores
4º ano	1.102	3.058	137	49	541	0	4886 árbores

## 04. Métodos de poda

- **Poda de mantemento do arborado de aliñación:** redución do volume de copa.
- **Poda de limpeza do arborado:** eliminación de pólas rotas, mal orientadas ou secas.
- **Poda de formación do arborado:** establecemento de ramas estruturais fortes.

## 05. Organización (3 equipos)

### MEDIOS HUMANOS

- 1 técnico (coordinador-supervisor)
- 3 oficiais podadores
- 3 operarios de sinalización e apilado
- 1 oficial condutor
- 1 operario de triturado (para compost)


### MEDIOS MATERIAIS

- 3 plataformas autopropulsadas e monotripuladas
- 1 furgoneta con remolque lixeiro
- 1 camión con pluma de recollida
- 1 desfibradora forestal
- 3 motoserras eléctricas
- 3 tesoiras eléctricas
- 1 cortasebes eléctricos




## 06. Equipos de traballos e ámbitos

- **Grupo 1 FONTIÑAS-SAN LÁZARO**  
do 27/10/2014 ao 27/03/2015  
duración: 112,75 días  
número de árbores: 3.481
- **Grupo 2 ENSANCHE-RESTOLLAL-PARROQUIAS-SUR**  
do 27/10/2014 ao 27/03/2015  
duración: 112,58 días  
número de árbores: 3.153
- **Grupo 3 GALERAS-AUDITORIO-BONAVAL**  
do 27/10/2014 ao 02/04/2015  
duración: 113,88 días  
número de árbores: 3.066

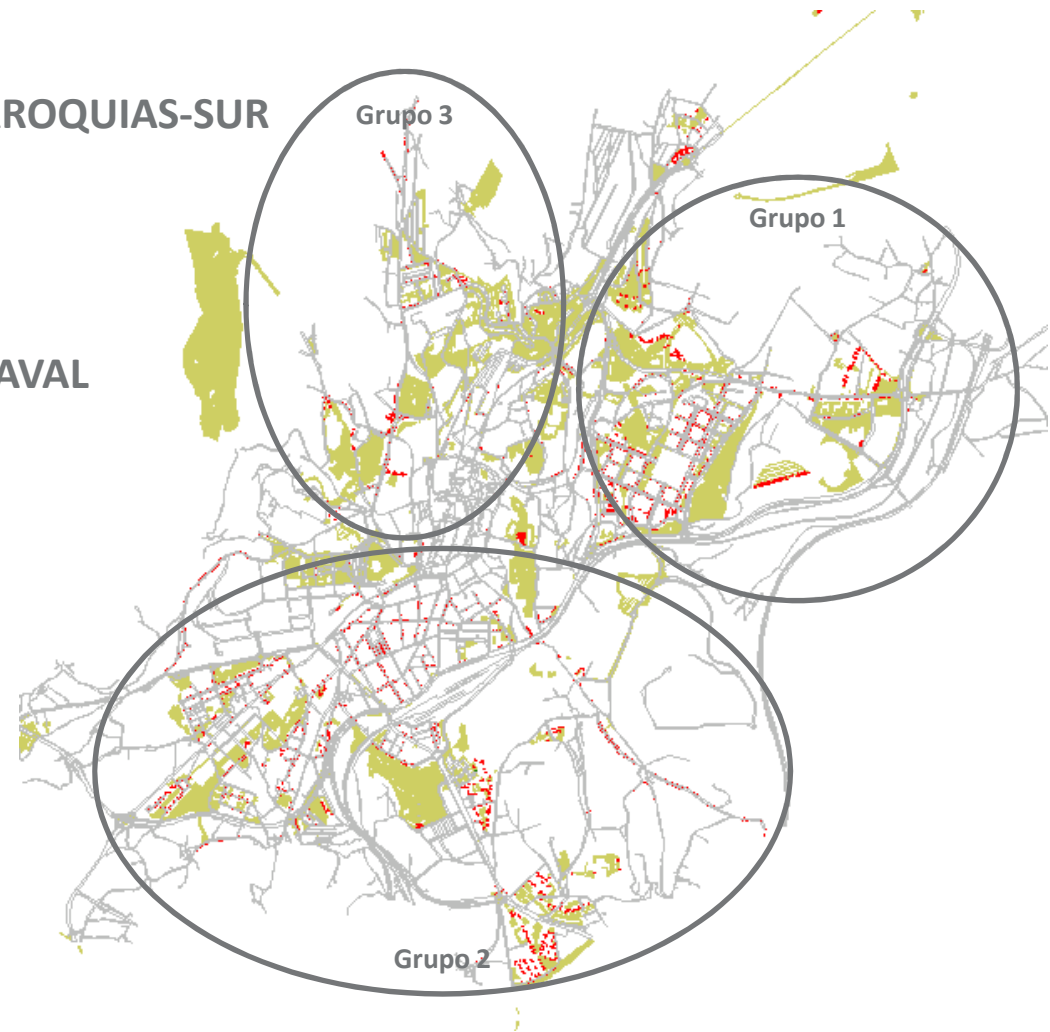

# 07. Programación

Grupo 1 FONTIÑAS-SAN LÁZARO

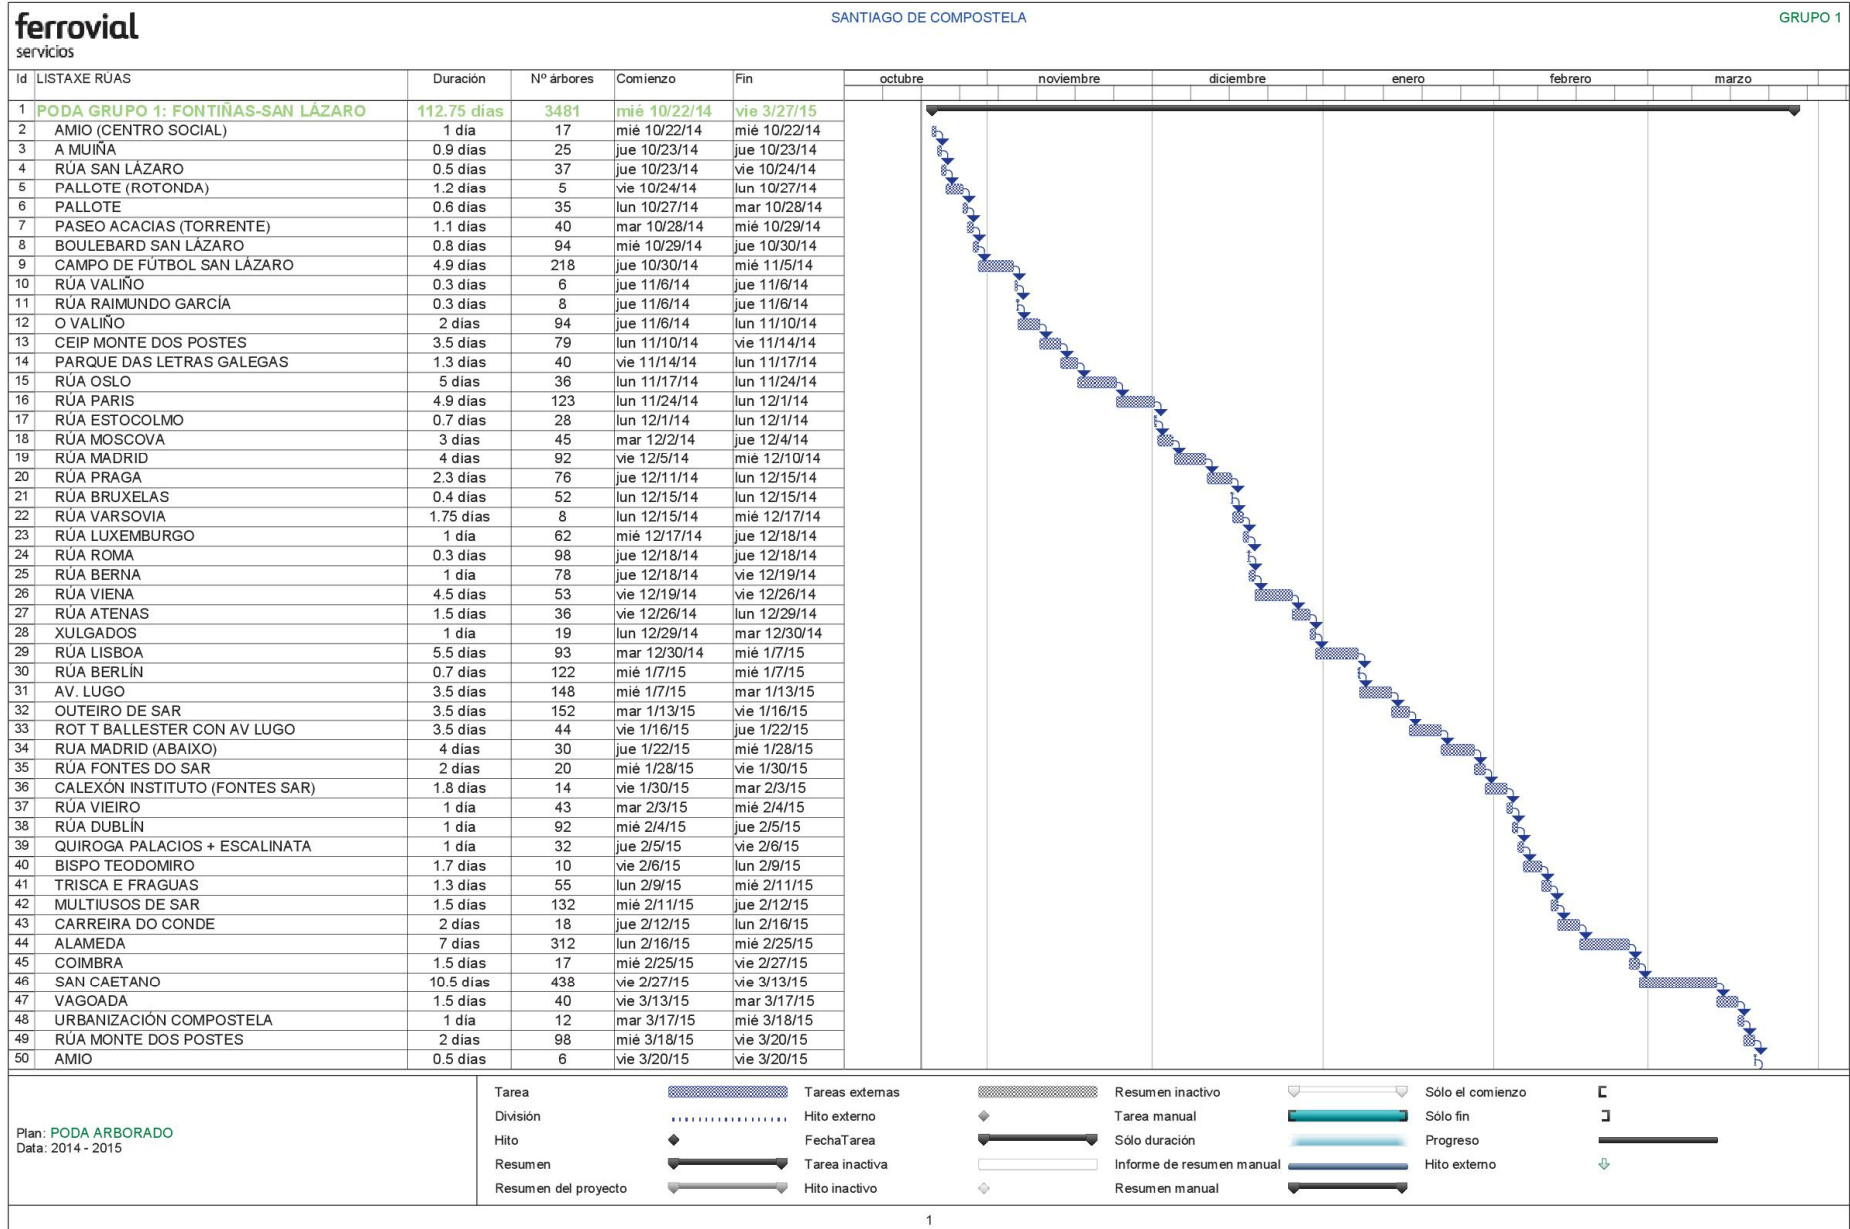



Grupo 2 ENSANCHE-RESTOLLAL-SUR-PARROQUIAS

ferrovial  
servicios

SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRUPO 2

Id	LISTAXE RÚAS	Duración	Nº árbores	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo
1	<b>PODA GRUPO 2: ENSANCHE-RESTOLLAL SUR-PARROQUIAS</b>	<b>112.58 días</b>	<b>3153</b>	<b>mié 10/22/14</b>	<b>vie 3/27/15</b>						
2	COLEXIATA DE SAR	0.6 días	8	mié 10/22/14	mié 10/22/14						
3	TRAV. PONTE SAR (PR. MUÍÑOS)	0.4 días	6	mié 10/22/14	mié 10/22/14						
4	RÚA PONTE E CRUCEIRO DO SAR	11.75 días	193	jue 10/23/14	vie 11/7/14						
5	RÚA CANTEIROS DE SAR	0.6 días	16	vie 11/7/14	lun 11/10/14						
6	AGRA DAS BARREIRAS	2.5 días	18	lun 11/10/14	mié 11/12/14						
7	CEIP LAMAS DE ABADE	3.1 días	86	mié 11/12/14	lun 11/17/14						
8	LAMAS DE ABADE	3.15 días	93	lun 11/17/14	vie 11/21/14						
9	COMBARRO	1.1 días	23	vie 11/21/14	lun 11/24/14						
10	CASTIÑEIRIÑO	1.5 días	23	lun 11/24/14	mar 11/25/14						
11	VUELVA MAÑANA	5.28 días	92	mar 11/25/14	mar 12/2/14						
12	ESCULTOR CAMILO OTERO (EUG GRANELL)	2.29 días	44	mar 12/2/14	vie 12/5/14						
13	PINTOR JUAN LUIS (EUG GRANELL)	0.35 días	8	vie 12/5/14	vie 12/5/14						
14	AMOR RUIBAL + ENTRADA INSTITUTO	1.76 días	32	vie 12/5/14	mar 12/9/14						
15	ULLA, VEDRA, BOQUEIXÓN	1.76 días	38	mar 12/9/14	jue 12/11/14						
16	LUIS IGLESIAS, ISIDRO PARGA	1.76 días	40	jue 12/11/14	vie 12/12/14						
17	ROMERO DONAIO	1.06 días	9	vie 12/12/14	lun 12/15/14						
18	STA MARTA	4.75 días	33	lun 12/15/14	lun 12/22/14						
19	DR MACEIRA	0.3 días	5	lun 12/22/14	mar 12/23/14						
20	AV BARCELONA	6.16 días	155	mar 12/23/14	mié 12/31/14						
21	AV BILBAO	1.5 días	24	mié 12/31/14	jue 1/1/15						
22	CHOUpana	2.64 días	22	jue 1/1/15	mar 1/6/15						
23	VOLTA DO CASTRO	3.52 días	131	mar 1/6/15	vie 1/9/15						
24	CONXO PLAZA	0.53 días	14	vie 1/9/15	lun 1/12/15						
25	CONXO ROTONDA	1 día	8	lun 1/12/15	mar 1/13/15						
26	BENÉFICA DE CONXO	0.9 días	34	mar 1/13/15	mié 1/14/15						
27	AV GARCIA PRIETO	1.1 días	17	mié 1/14/15	jue 1/15/15						
28	PONTE PEREDA	3.52 días	71	jue 1/15/15	mar 1/20/15						
29	PR MERCED	1.3 días	18	mar 1/20/15	jue 1/22/15						
30	LUIS PASIN	3.75 días	158	jue 1/22/15	mar 1/27/15						
31	ENSANCHE	14.35 días	530	mar 1/27/15	mar 2/17/15						
32	CONSTITUCIÓN	3.75 días	69	mar 2/17/15	lun 2/23/15						
33	LÓPEZ FERREIRO	1.76 días	31	lun 2/23/15	mar 2/24/15						
34	CANCELÓN DE SAR	1 día	21	mar 2/24/15	mié 2/25/15						
35	RAMÓN PIÑEIRO	1.35 días	6	mié 2/25/15	vie 2/27/15						
36	CASTRÓN DOURO	1 día	14	vie 2/27/15	lun 3/2/15						
37	CARREIRA DO CONDE	2.99 días	34	lun 3/2/15	jue 3/5/15						
38	PR SAN CLEMENTE	0.35 días	6	jue 3/5/15	jue 3/5/15						
39	ROXOS CAMPO DA FESTA	1.5 días	75	jue 3/5/15	vie 3/6/15						
40	ROXOS CEIP	1.5 días	132	vie 3/6/15	mar 3/10/15						
41	LARAÑO	1.5 días	92	mar 3/10/15	mié 3/11/15						
42	CÉSAR	1.5 días	86	mié 3/11/15	vie 3/13/15						
43	BERDÍA	3.7 días	229	vie 3/13/15	jue 3/19/15						
44	BUSTO	2.15 días	310	jue 3/19/15	lun 3/23/15						
45	PEREGRINA	0.75 días	35	lun 3/23/15	mar 3/24/15						
46	LAVACOLLA	1.5 días	64	mar 3/24/15	mié 3/25/15						
47	MARXE PARA IMPREVISTOS	2 días	0	mié 3/25/15	vie 3/27/15						

Plan: **PODA ARBORADO**  
Data: 2014 - 2015

Tarea		Tareas externas		Resumen inactivo		Sólo el comienzo	
División		Hito externo		Tarea manual		Sólo fin	
Hito		FechaTarea		Sólo duración		Progreso	
Resumen		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Resumen manual			



Id	LISTAXE RÚAS	Duración	Nº árboles	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo
1	<b>PODA GRUPO 3: GALERAS-AUDITORIO-BONAVAL</b>	<b>113.88 días</b>	<b>3066</b>	<b>lun 10/27/14</b>	<b>jue 4/2/15</b>						
2	RÚA STA COMBA (SAN XOAN)	2.81 días	45	lun 10/27/14	mié 10/29/14						
3	RÚA VISTA ALEGRE	1.87 días	96	mié 10/29/14	vie 10/31/14						
4	PARQUE VISTA ALEGRE	2.81 días	51	vie 10/31/14	mié 11/5/14						
5	PARQUE SAN XOAN	1.87 días	36	mié 11/5/14	vie 11/7/14						
6	CAPELA SAN XOAN	0.94 días	24	vie 11/7/14	lun 11/10/14						
7	AV CASTELAO	8.42 días	138	lun 11/10/14	jue 11/20/14						
8	XESUS CARRO	2 días	41	jue 11/20/14	lun 11/24/14						
9	CARLOS MASIDE	1.5 días	35	lun 11/24/14	mié 11/26/14						
10	ALEXANDRE BÓBEDA (ATA VAGOADA)	5.61 días	112	mié 11/26/14	mié 12/3/14						
11	FERMIN BOUZA BREI	1.87 días	40	mié 12/3/14	vie 12/5/14						
12	GARCÍA LORCA, CELSO EMILIO	1.87 días	65	vie 12/5/14	mar 12/9/14						
13	PABLO IGLESIAS	13.09 días	307	mar 12/9/14	vie 12/26/14						
14	SALVADOR ALLENDE	1.1 días	23	vie 12/26/14	lun 12/29/14						
15	RÚA GALERAS	1.87 días	44	lun 12/29/14	mié 12/31/14						
16	CAMPO DE STA ISABEL	1.87 días	37	mié 12/31/14	vie 1/2/15						
17	MORÓN	2.81 días	142	vie 1/2/15	mié 1/7/15						
18	COSTA DE STA ISABEL	0.94 días	29	mié 1/7/15	jue 1/8/15						
19	FRENTE INSTITUTO XEOGRÁFICO	1.87 días	41	jue 1/8/15	lun 1/12/15						
20	ENTRADA MONTE PIO	1.87 días	32	lun 1/12/15	mar 1/13/15						
21	RÚA MONTE PIO	1.87 días	49	mar 1/13/15	jue 1/15/15						
22	CAMALLÓNS	1.12 días	31	jue 1/15/15	vie 1/16/15						
23	PADRE FEIJOO	1.5 días	32	vie 1/16/15	mar 1/20/15						
24	PELAMIOS	3.74 días	97	mar 1/20/15	lun 1/26/15						
25	FINCA SIMEÓN	1.87 días	35	lun 1/26/15	mié 1/28/15						
26	RICARDO CARVALHO CALERO	1.25 días	45	mié 1/28/15	jue 1/29/15						
27	PONTE MANTIBLE	1 día	21	jue 1/29/15	vie 1/30/15						
28	IRMANDIÑOS (FRENTE ILGA)	1.76 días	35	vie 1/30/15	mar 2/3/15						
29	BLANCO AMOR	2.64 días	51	mar 2/3/15	jue 2/5/15						
30	SAN CAETANO	3.52 días	82	jue 2/5/15	mié 2/11/15						
31	OTERO PEDRAIO	1 día	23	mié 2/11/15	jue 2/12/15						
32	PASTORIZA	1 día	21	jue 2/12/15	vie 2/13/15						
33	ANXO CASAL, CAMILO DIAZ VALIÑO	6.5 días	367	vie 2/13/15	lun 2/23/15						
34	RODRIGUEZ VIGURI	2 días	37	lun 2/23/15	mié 2/25/15						
35	SALGUEIRIÑOS ARRIBA E ABAIXO	0.5 días	14	mié 2/25/15	jue 2/26/15						
36	POZO DA NEVE	0.75 días	20	jue 2/26/15	vie 2/27/15						
37	URB. MEIXONFRIO	1.41 días	42	vie 2/27/15	lun 3/2/15						
38	PR ULTREIA	1.76 días	34	lun 3/2/15	mié 3/4/15						
39	XOAN XXIII	4 días	142	mié 3/4/15	mar 3/10/15						
40	STA CLARA	0.5 días	14	mar 3/10/15	mar 3/10/15						
41	COIMBRA	3.52 días	75	mar 3/10/15	lun 3/16/15						
42	PARQUE XIXON	3.52 días	117	lun 3/16/15	jue 3/19/15						
43	RÚA CASTAÑOS	1.06 días	22	jue 3/19/15	vie 3/20/15						
44	SAN FRANCISCO	1.5 días	32	vie 3/20/15	mar 3/24/15						
45	PORTA DA PENA (HOSTAL)	1 día	21	mar 3/24/15	mié 3/25/15						
46	PRAZA SAN ROQUE	0.5 días	12	mié 3/25/15	mié 3/25/15						
47	RÚA TOURO, ALMÁCIGA	4.1 días	257	mié 3/25/15	mar 3/31/15						
48	MARXE PARA IMPREVISTOS	2 días	0	mar 3/31/15	jue 4/2/15						

Plan: **PODA ARBORADO**  
Data: 2014 - 2015

Tarea		Tareas externas		Resumen inactivo		Sólo el comienzo	
División		Hito externo		Tarea manual		Sólo fin	
Hito		FechaTarea		Sólo duración		Progreso	
Resumen		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Resumen manual			

